


DIAGRAMME DE PERT —

SPAA — planning prévisionnel (3 juillet → 4 septembre 2026)

Ce diagramme représente le réseau de dépendances entre les phases du projet, avec pour chaque tâche sa durée estimée ainsi que ses dates de début et de fin. Le projet se déroule sur 9 semaines, du lancement le 3 juillet à la mise en ligne le 4 septembre 2026.

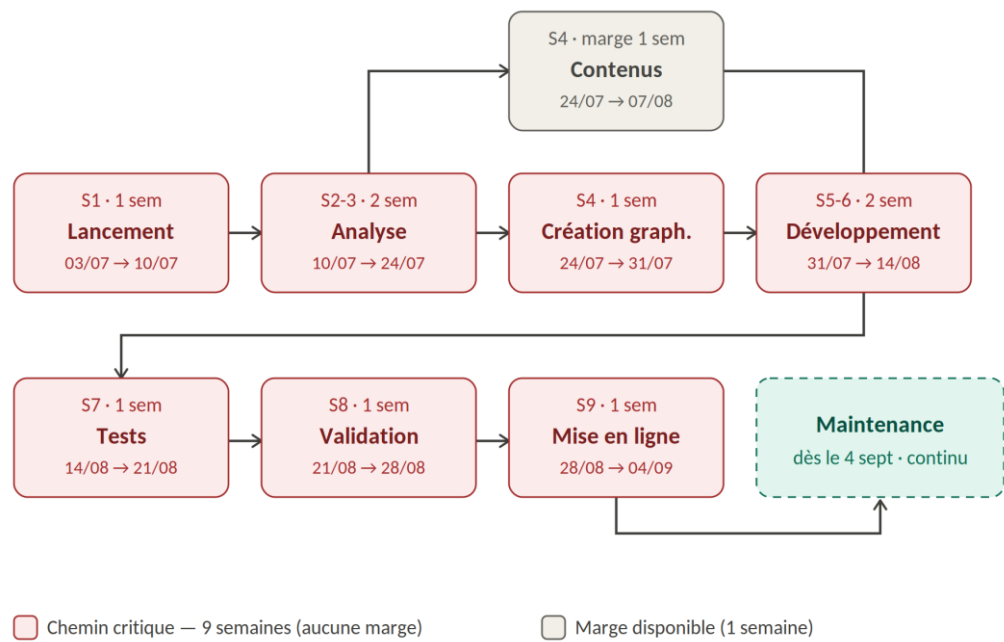

Lecture du diagramme

Le chemin critique — Lancement, Analyse des besoins, Création graphique, Développement, Tests, Validation client, Mise en ligne — totalise 9 semaines. Un retard sur l'une de ces tâches décale directement la date de mise en ligne du 4 septembre.

La préparation des contenus dispose d'une semaine de marge : elle peut être menée en parallèle du développement sans impacter le planning global, tant qu'elle est terminée pour le 7 août.

La création du logo et de la charte graphique a été ajoutée au planning, l'association ne disposant à ce jour d'aucune identité visuelle. La maintenance démarre dès la mise en ligne, le 4 septembre, et se poursuit en continu.

Détail des tâches

Phase	Durée	Début	Fin	Critique
Lancement du projet	1 sem	03/07/2026	10/07/2026	Oui
Analyse des besoins	2 sem	10/07/2026	24/07/2026	Oui
Création graphique	1 sem	24/07/2026	31/07/2026	Oui
Préparation des contenus	2 sem	24/07/2026	07/08/2026	Non
Développement	2 sem	31/07/2026	14/08/2026	Oui
Tests	1 sem	14/08/2026	21/08/2026	Oui
Validation client	1 sem	21/08/2026	28/08/2026	Oui
Mise en ligne	1 sem	28/08/2026	04/09/2026	Oui
Maintenance	continu	04/09/2026	—	—

Durée totale du projet : 9 semaines (03 juillet → 04 septembre 2026).
Les durées et dates ont été fixées avec l'association ; elles pourront être ajustées en fonction des disponibilités réelles et de la rapidité de fourniture des contenus et validations.
